

Data reunião comitê

julho 14, 2023




Monitoramento da execução do portfólio proposto

Área	Concepção	Execução	Não iniciado	Planejamento	Total das linhas
Atendimento	1	1			2
Gestão		2	1		3
Infraestrutura		11		1	12
Sistemas	1	5		4	10
Total geral	2	19	1	5	27


3

Total de novos projetos


Total de projetos




Novos projetos propostos

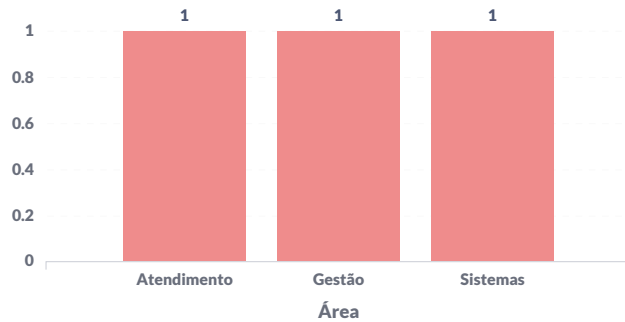

Projetos do portfólio proposto, por área finalística

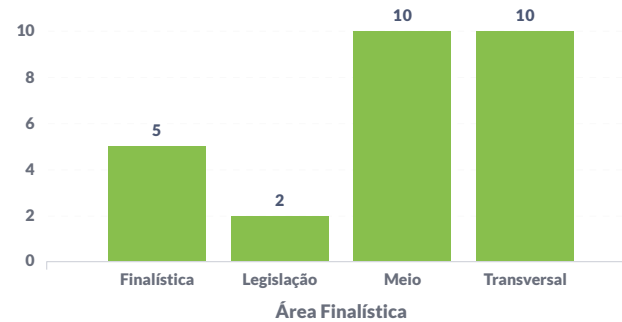

Projetos repactuados de portfólio(s) anterior(es)

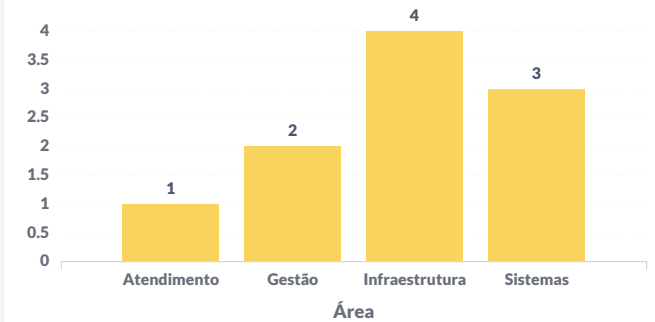

Monitoramento do portfólio proposto (completo)

^ Codigo Projeto	^ Nome	^ Status	^ Etapa	^ Prazo	^ Data Repactuacao	^ Adicionado	^ Trimestre Entrada	^ Area Finalistica
SIS-17	Encargos Acadêmicos no SIGAA	72%	Execução	30/6/2023	31/8/2023	Não	4T2022	Finalística
SIS-20	Aperfeiçoamento do serviço de redirecionamento de e-mail de alunos	40%	Execução	30/6/2023	31/8/2023	Não	4T2022	Finalística
SIS-26	Interface para consulta de patrimônio legado	75%	Execução	30/6/2023	31/8/2023	Não	2T2023	Meio
SIS-27	Implantação do módulo de bolsas	15%	Planejamento	30/9/2023	-	Não	2T2023	Meio
SIS-28	Implantação do módulo restaurantes: fase planejamento e levantamento de requisitos	10%	Planejamento	30/9/2023	-	Não	2T2023	Meio
SIS-29	Aperfeiçoamento emergencial do Módulo Restaurante offline	70%	Execução	31/7/2023	-	Não	2T2023	Meio
SIS-30	Atualização tecnológica da IU	11%	Planejamento	31/12/2023	-	Não	2T2023	Meio
SIS-32	Atualização do sistema Polare (Versão 1.0)	72%	Execução	31/7/2023	-	Não	2T2023	Meio
SIS-33	Portais DPPG (SIGAA)	5%	Planejamento	31/8/2023	-	Não	2T2023	Legislação
SIS-34	Implementação da Resolução 20/2022 CEPE no SIGAA	2%	Concepção	30/9/2023	-	Sim	3T2023	Finalística

INFRA-31	Aquisição de equipamentos de backup	23%	Execução	31/7/2023	-	Não	3T2022	Transversal
INFRA-34	Implantação de firewall nas unidades	60%	Execução	31/7/2023	-	Não	3T2022	Transversal
INFRA-46	Implantação do ansible para atualização do SIG SO	16%	Execução	31/5/2023	30/9/2023	Não	3T2022	Transversal
INFRA-52	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	96%	Execução	31/7/2023	-	Não	4T2022	Meio
INFRA-53	Migração do Moodle legado dos cursos técnicos EAD	90%	Execução	30/4/2023	30/9/2023	Não	4T2022	Finalística
INFRA-57	Aquisição de Licença de Firewall	20%	Execução	31/12/2023	-	Não	4T2022	Transversal
INFRA-63	Contratação estações de trabalho	60%	Execução	31/12/2023	-	Não	2T2023	Transversal
INFRA-64	Readequação da rede do Campus Nova Gameleira	15%	Planejamento	30/6/2023	31/12/2023	Não	2T2023	Transversal
INFRA-65	Instalação do cluster HPC de pesquisa	60%	Execução	30/9/2023	-	Não	2T2023	Finalística
INFRA-68	Implantação do Graylog	98%	Execução	30/6/2023	31/8/2023	Não	2T2023	Transversal
INFRA-72	Modelo de utilização do Ansible	60%	Execução	31/7/2023	-	Não	2T2023	Transversal
INFRA-76	Migração de dados para o novo Storage	45%	Execução	30/9/2023	-	Não	2T2023	Transversal
SUP-4	Definição de Acordo de Nível de Serviços dos serviços de TI	5%	Concepção	31/3/2023	30/9/2023	Sím	3T2022	Meio
SUP-8	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	90%	Execução	31/7/2023	-	Não	4T2022	Meio
GESTAO-4	Realização de ações para a Transformação Digital	85%	Execução	30/6/2023	30/9/2023	Não	1T2022	Legislação
GESTAO-7	Formalização e aperfeiçoamento do processo de gestão de mudanças	60%	Execução	30/6/2023	30/9/2023	Não	3T2022	Meio
GESTAO-14	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks	0%	Não iniciado	30/9/2023	-	Sím	3T2023	Transversal
