

Data reunião comitê

outubro 10, 2023



Área




Monitoramento da execução do portfólio proposto



Area - ID Area - Desc	Execução	Não iniciado	Planejamento	Total das linhas
Atendimento	2	1		3
Gestão	4			4
Infraestrutura	10	1	2	13
Sistemas	6	2	1	9
Total geral	22	4	3	29

Total de projetos

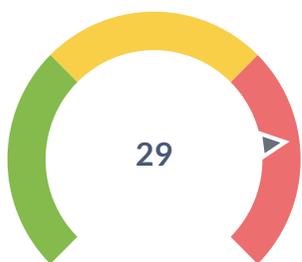


29


7

Total de novos projetos


Total de projetos no período (histórico)

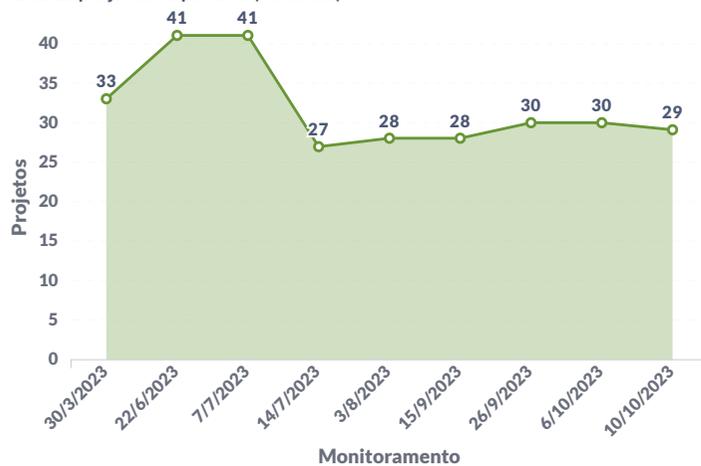


Novos projetos propostos

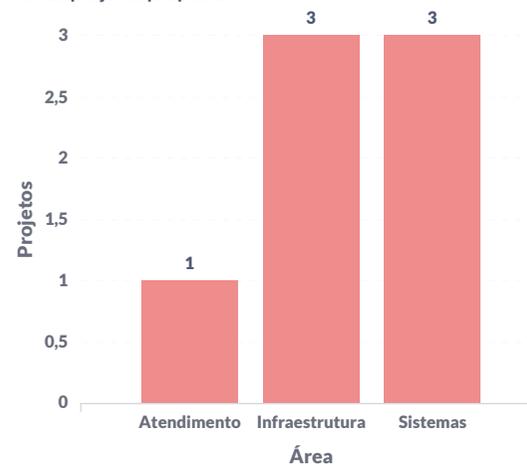

Projetos do portfólio proposto, por área finalística

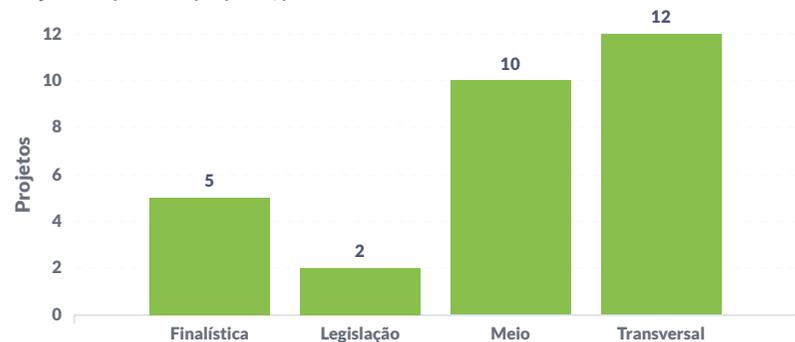

Projetos repactuados de portfólio(s) anterior(es)


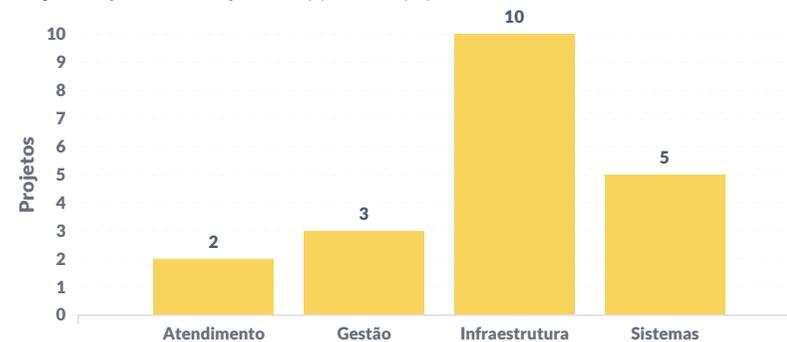


Área Finalística

Área

Monitoramento do portfólio proposto (completo)

^ Codigo Projeto	^ Nome	^ Status	^ Etapa	^ Prazo	^ Data Repactuacao	^ Adicionado	^ Trimestre Entrada	^ Area Finalistica
SIS-27	Implantação do módulo de bolsas	65% <div style="width: 65%;"><div style="width: 65%;"></div></div>	Execução	30/9/2023	30/11/2023	Não	2T2023	Meio
SIS-28	Implantação do módulo restaurantes: fase planejamento e levantamento de requisitos	85% <div style="width: 85%;"><div style="width: 85%;"></div></div>	Execução	30/9/2023	31/10/2023	Não	2T2023	Meio
SIS-29	Aperfeiçoamento emergencial do Módulo Restaurante offline	91% <div style="width: 91%;"><div style="width: 91%;"></div></div>	Execução	31/7/2023	31/10/2023	Não	2T2023	Meio
SIS-30	Atualização tecnológica da IU	25% <div style="width: 25%;"><div style="width: 25%;"></div></div>	Execução	31/12/2023	-	Não	2T2023	Meio
SIS-33	Portais DPPG (SIGAA)	45% <div style="width: 45%;"><div style="width: 45%;"></div></div>	Execução	31/8/2023	30/11/2023	Não	2T2023	Legislação
SIS-34	Implementação da Resolução 20/2022 CEPE no SIGAA	75% <div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div>	Execução	30/9/2023	31/10/2023	Não	3T2023	Finalística
SIS-35	Desenvolvimento de Formulário para Avaliações Somativas	6% <div style="width: 6%;"><div style="width: 6%;"></div></div>	Planejamento	31/10/2023	-	Sim	4T2023	Finalística
SIS-36	Implantação do SIAR (SIG)	0% <div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div>	Não iniciado	31/3/2024	-	Sim	4T2023	Meio
SIS-37	Implantação do módulo Assistência ao Estudante	0% <div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div>	Não iniciado	30/6/2024	-	Sim	4T2023	Meio
INFRA-31	Aquisição de equipamentos de backup	25% <div style="width: 25%;"><div style="width: 25%;"></div></div>	Execução	31/7/2023	31/12/2023	Não	3T2022	Transversal
INFRA-34	Implantação de firewall nas unidades	75% <div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div>	Execução	31/7/2023	31/1/2024	Não	3T2022	Transversal
INFRA-46	Implantação do ansible para atualização do SIG SO	18% <div style="width: 18%;"><div style="width: 18%;"></div></div>	Execução	31/5/2023	31/1/2024	Não	3T2022	Transversal
INFRA-52	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	96% <div style="width: 96%;"><div style="width: 96%;"></div></div>	Execução	31/7/2023	31/12/2023	Não	4T2022	Meio
INFRA-53	Migração do Moodle legado dos cursos técnicos EAD	90% <div style="width: 90%;"><div style="width: 90%;"></div></div>	Execução	30/4/2023	31/12/2023	Não	4T2022	Finalística
INFRA-57	Aquisição de Licença de Firewall	88% <div style="width: 88%;"><div style="width: 88%;"></div></div>	Execução	31/12/2023	31/12/2023	Não	4T2022	Transversal
INFRA-64	Readequação da rede do Campus Nova Gameleira	75% <div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div>	Execução	30/6/2023	28/2/2024	Não	2T2023	Transversal
INFRA-65	Instalação do cluster HPC de pesquisa	81% <div style="width: 81%;"><div style="width: 81%;"></div></div>	Execução	30/9/2023	31/12/2023	Não	2T2023	Finalística
INFRA-68	Implantação do Graylog	98% <div style="width: 98%;"><div style="width: 98%;"></div></div>	Execução	30/6/2023	31/10/2023	Não	2T2023	Transversal
INFRA-76	Migração de dados para o novo Storage	70% <div style="width: 70%;"><div style="width: 70%;"></div></div>	Execução	30/9/2023	31/12/2023	Não	2T2023	Transversal
INFRA-79	Adequação da rede da DTI para 10G	1% <div style="width: 1%;"><div style="width: 1%;"></div></div>	Planejamento	31/12/2023	-	Sim	4T2023	Transversal
INFRA-80	Infraestrutura para o sistema Integra	1% <div style="width: 1%;"><div style="width: 1%;"></div></div>	Planejamento	31/12/2023	-	Sim	4T2023	Finalística
INFRA-81	Implantação do novo CFTV	0% <div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div>	Não iniciado	31/12/2023	-	Sim	4T2023	Transversal
SUP-4	Definição de Acordo de Nível de Serviços dos serviços de TI	20% <div style="width: 20%;"><div style="width: 20%;"></div></div>	Execução	31/3/2023	31/12/2023	Não	3T2022	Meio
^	^	^	^	^	^	^	^	^
SUP-8	Atualização tecnológica para segurança do GLPI	90% <div style="width: 90%;"><div style="width: 90%;"></div></div>	Execução	31/7/2023	30/11/2023	Não	4T2022	Meio
SUP-9	Implantação da autenticação de rede baseada em controle de acesso (SAMBA/802.1x) no Campus NS	0% <div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div>	Não iniciado	31/3/2024	-	Sim	4T2023	Transversal

GESTAO-4	Realização de ações para a Transformação Digital	86% 	Execução	30/6/2023	31/12/2023	Não	1T2022	Legislação
GESTAO-7	Formalização e aperfeiçoamento do processo de gestão de mudanças	65% 	Execução	30/6/2023	31/12/2023	Não	3T2022	Meio
GESTAO-14	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks	10% 	Execução	30/9/2023	31/12/2023	Não	3T2023	Transversal
GESTAO-15	Renovação do contrato de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP)	8% 	Execução	24/10/2023	-	Não	3T2023	Transversal
